



ADMINISTRAÇÃO PARA PLANEAMENTO DE REDES, ENGENHARIA, REGÕES SUL E LESTE

## OBRAS CONCLUÍDAS E FECHADAS - PIP (FUNDOS EXTERNOS)



FEVEREIRO/2021



## DESCRIÇÃO: PROJECTO DE ELECTRIFICAÇÃO DA PROVINCIA DO HUAMBO - LCC

### RELATÓRIO FINAL DO PROJECTO

Mês: Fevereiro Ano 2021

#### Dados do Contrato

Empreiteiro	Financiamento	Orçamento	Local	Prazo de Execução
CMEC	Linha de Credito da China (LCC) ROT: Recursos Ordinários do Tesouro	60,000,000.00	Huambo	Asinatura do Contrato: 15-06-2016 Auto de Consignação: 13-09-2016 Prazo Contratual inicial: 18 meses Fiscalização: DAR


#### Previsão do Projecto

Descrição	Previsto	Executado (%)	Concluído (%)	Observações
Construção de Subestação de 60/15 KV	3	3	100%	Obra concluída e Fechada no exercício 2019
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km)	17	17	100%	
Montagem de Postos de Transformação e Construção das Redes de Média e Baixa Tensão	100	100	100%	
Ligações Domiciliares	20000	20000	100%	

#### Execução Financeira

Descrição	Previsto	Executado (%)	Concluído (%)	Observações
Adiantamento	9,000,000.00	9,000,000.00	100%	Obra concluída e Fechada no exercício 2019
Fornecimentos	39,709,560.79	39,709,560.79	100%	
Montagem e Serviços	16,773,653.01	16,773,653.01	100%	
Expropriação e Indeminização	1,500,000.00	1,500,000.00	100%	
Direitos e Despesas Alfandegárias	2,016,786.20	2,016,786.20	100%	
<b>Total</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>100%</b>	

#### REPRESENTAÇÃO GRAFICA





## DESCRIÇÃO: PROJECTO DE ELECTRIFICAÇÃO DA PROVINCIA DE CABINDA - LCC

### RELATÓRIO FINAL DO PROJECTO

Mês: Fevereiro Ano 2021

#### Dados do Contrato

Empreiteiro	Financiamento	Orçamento	Local	Prazo de Execução
CBITEC	Linha de Credito da China (LCC) ROT: Recursos Ordinários do Tesouro	59,995,785.90	Cabinda	Assinatura do Contrato: 13-06-2016 Início da Obra: 21-09-2016, início efectivo Maio 2017 Prazo Contratual inicial: 18 meses Fiscalização: BDM- Engenharia e Tecnologias, Lda


#### Previsão do Projecto

Descrição	Previsto	Executado (%)	Concluído (%)	Observações
Construção de Subestação de 60/15 KV	3	3	100%	Obra concluída e Fechada no exercício 2019
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km)	50	50	100%	
Montagem de Postos de Transformação e Construção das Redes de Média e Baixa Tensão	64	64	100%	
Ligações Domiciliares	17500	17500	100%	

#### Execução Financeira

Descrição	Previsto	Executado	Concluído (%)	Observações
Adiantamento	8,999,367.89	8,999,367.89	100%	Obra concluída e Fechada no exercício 2019
Fornecimentos	38,956,914.38	38,956,914.38	100%	
Montagem e Serviços	15,293,497.00	15,293,497.00	100%	
Expropriação e Indeminização	3,797,528.80	3,797,528.80	100%	
Direitos e Despesas Alfandegárias	1,947,845.72	1,947,845.72	100%	
<b>Total</b>	<b>59,995,785.90</b>	<b>59,995,785.90</b>	<b>100%</b>	

#### REPRESENTAÇÃO GRAFICA





## DESCRIÇÃO: PROJECTO DE ELECTRIFICAÇÃO DA PROVINCIA DE BENGUELA - LCC

### RELATÓRIO FINAL DO PROJECTO

Mês: Fevereiro Ano 2021

#### Dados do Contrato

Empreiteiro	Financiamento	Orçamento	Local	Prazo de Execução
CBITEC	Linha de Credito da China (LCC) ROT: Recursos Ordinários do Tesouro	89,985,988.28	Benguela	Asinatura do Contrato: 16-06-2016 Auto de Consignação: 12-09-2016 Prazo Contratual inicial: 18 meses Fiscalização: Coba Angola


#### Previsão do Projecto

Descrição	Previsto	Executado (%)	Concluído (%)	Observações
Construção de Subestação de 60/15 KV	4	4	100%	Obra concluída e Fechada no exercício 2019
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km)	41	41	100%	
Montagem de Postos de Transformação e Construção das Redes de Média e Baixa Tensão	111	111	100%	
Ligações Domiciliares	2250	2250	100%	

#### Execução Financeira

Descrição	Previsto	Executado	Concluído (%)	Observações
Adiantamento	13,497,898.24	13,497,898.24	100%	Obra concluída e Fechada no exercício 2019
Fornecimentos	66,172,583.96	66,172,583.96	100%	
Montagem e Serviços	15,801,476.54	15,801,476.54	100%	
Expropriação e Indeminização	1,703,298.59	1,703,298.59	100%	
Direitos e Despesas Alfandegárias	3,308,629.20	3,308,629.20	100%	
	2,999,999.99	2,999,999.99	100%	
<b>Total</b>	<b>89,985,988.28</b>	<b>89,985,988.28</b>	<b>100%</b>	

#### REPRESENTAÇÃO GRAFICA





## DESCRIÇÃO: PROJECTO DE ELECTRIFICAÇÃO DA PROVINCIA DE LUANDA - LCC

### RELATÓRIO FINAL DO PROJECTO

Mês: Fevereiro Ano 2021

#### Dados do Contrato

Empreiteiro	Financiamento	Orçamento	Local	Prazo de Execução
SINHOYDRO	Linha de Credito da China (LCC) ROT: Recursos Ordinários do Tesouro	675,000,000.00	Luanda	Assinatura do Contrato: 12-06-2016 Auto de Consignação: 08-09-2016 Prazo Contratual inicial: 24 meses Fiscalização: Benergy


#### Previsão do Projecto

Descrição	Previsto	Executado (%)	Concluído (%)	Observações
Construção de Subestação de 60/15 KV	9	9	100%	Obra concluída e Fechada no exercício 2020
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km)	5	5	100%	
Montagem de Postos de Transformação e Construção das Redes de Média e Baixa Tensão	1000	1000	100%	
Ligações Domiciliares	300000	300000	100%	

#### Execução Financeira

Descrição	Previsto	Executado	Concluído (%)	Observações
Adiantamento	101,250,000.00	101,250,000.00	100%	Obra concluída e Fechada no exercício 2020
Fornecimentos	375,359,984.99	375,359,984.99	100%	
Montagem e Serviços	234,575,936.01	234,575,936.01	100%	
Expropriação e Indeminização	3,496,980.00	3,496,980.00	100%	
Direitos e Despesas Alfandegárias	15,014,399.00	15,014,399.00	100%	
Centro de Despacho	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	
Acções Complementares	42,000,000.00	42,000,000.00	100%	
<b>Total</b>	<b>675,447,300.00</b>	<b>675,447,300.00</b>	<b>100%</b>	

#### REPRESENTAÇÃO GRAFICA

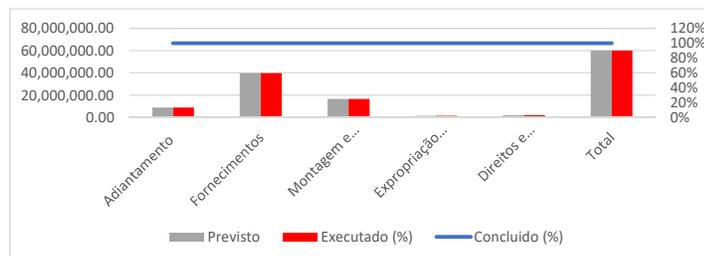



## DESCRIÇÃO: PROJECTO DE ELECTRIFICAÇÃO DA PROVINCIA DE ZAIRE - LCC

### RELATÓRIO FINAL DO PROJECTO

Mês: Fevereiro Ano 2021

#### Dados do Contrato

Empreiteiro	Financiamento	Orçamento	Local	Prazo de Execução
TBEA	Linha de Credito da China (LCC) ROT: Recursos Ordinários do Tesouro	435,517,852.00	Zaire	Asinatura do Contrato: 06-10-2016 Auto de Consignação: Abril de 2017 Prazo Contratual inicial: 30 meses Fiscalização: Benergy


#### Previsão do Projecto

Descrição	Previsto	Executado (%)	Concluído (%)	Observações
Construção de Subestação de 60/15 KV	6	6	100%	Obra concluída e Fechada no exercício 2021
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km)	457	457	100%	
Montagem de Postos de Transformação e Construção das Redes de Média e Baixa Tensão	112	112	100%	
Ligações Domiciliares	12040	12040	100%	

#### Execução Financeira

Descrição	Previsto	Executado	Concluído (%)	Observações
Adiantamento	65,327,677.80	65,327,677.80	100%	Obra concluída e Fechada no exercício 2021
Taxa de Contingência	12,099,545.00	12,099,545.00	100%	
Aparelhagem e Equipamentos	19,300,148.00	19,300,148.00	100%	
Serviços Logísticos	800,000.00	800,000.00	100%	
Fornecimento e Montagem	337,990,481.20	337,990,481.20	100%	
<b>Total</b>	<b>435,517,852.00</b>	<b>435,517,852.00</b>	<b>100%</b>	

#### REPRESENTAÇÃO GRAFICA

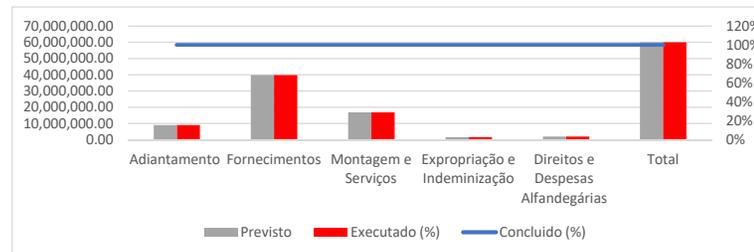



**DESCRIÇÃO: PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DE SE'S E LINHAS DE 60, 30, 20 KV NOS MUNICIPIOS DO LOBITO, CATUMBELA E BOCOIO**

**RELATÓRIO FINAL DO PROJECTO**

Mês: Fevereiro Ano 2021

**Dados do Contrato**

Empreiteiro	Financiamento	Orçamento inicial (USD)	Adenda ao Contrato (EURO)	Local	Prazo de Execução
CME		32,995,184.26	30,466,467.00	Benguela	Assinatura do Contrato: 19-11-2014 Início: 01-06-2018 Prazo Contratual inicial: 18 meses


**Previsão do Projecto**

Descrição	Previsto	Executado (%)	Concluído (%)	Observações
Construção de Subestação de 100MVA	3	3	100%	Obra concluída e Fechada no exercício 2021
Reabilitação de Subestação	1	1	100%	
Construção de Linhas de Alta Tensão	7.41	7.41	100%	
Construção de Linhas de Média Tensão	55578	55578	100%	
Montagem de Postos de Transformação e Construção das Redes de Média e Baixa Tensão	5	5	100%	

**Execução Financeira**

Descrição	Previsto (EURO)	Executado (EURO)	Concluído (%)	Observações
Adiantamento	4,569,970.05	4,569,970.05	100%	Obra concluída e Fechada no exercício 2021
Fornecimentos e Montagem	28,880,968.00	28,880,968.00	100%	
Custos Aduaneiros	1,524,479.00	1,524,479.00	100%	
Peças e Reservas	61,020.00	61,020.00	100%	
<b>Total</b>	<b>30,466,467.00</b>	<b>30,466,467.00</b>	<b>100%</b>	

**REPRESENTAÇÃO GRAFICA**

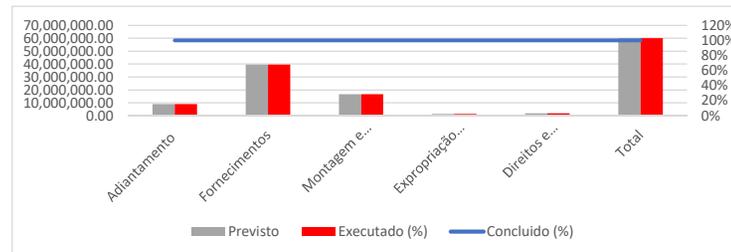



DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO, MONTAGEM E COMIÇÃO PARA ELECTRIFICAÇÃO DAS SEDES DE MUNICIPIOS DE DINGE, BUCO ZAU E BELIZE

RELATÓRIO FINAL DO PROJECTO

Mês: Fevereiro Ano 2021

Dados do Contrato

Empreiteiro	Financiamento	Orçamento (USD)	Local	Prazo de Execução
OMATAPALO		16,281,445.89	Cabinda	Asinatura do Contrato: 05 de Julho de 2013

Previsão do Projecto

Descrição	Previsto	Executado (%)	Concluído (%)	Observações
Montagem de Postos de Transformação e Construção das Redes de Média e Baixa Tensão	68	68	100%	Obra concluída e Fechada no exercício 2017
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>	

Execução Financeira

Descrição	Previsto	Previsto	Concluído (%)	Observações
Fornecimentos	8,791,980.77	8,791,980.77	100%	Obra concluída e Fechada no exercício 2017
Montagem e Serviços	7,489,465.12	7,489,465.12	100%	
<b>Total</b>	<b>16,281,445.89</b>	<b>16,281,445.89</b>	<b>100%</b>	

REPRESENTAÇÃO GRAFICA

